



梅州市梅江区城北镇玉西村-02拆旧复垦项目竣工图（东风小组）

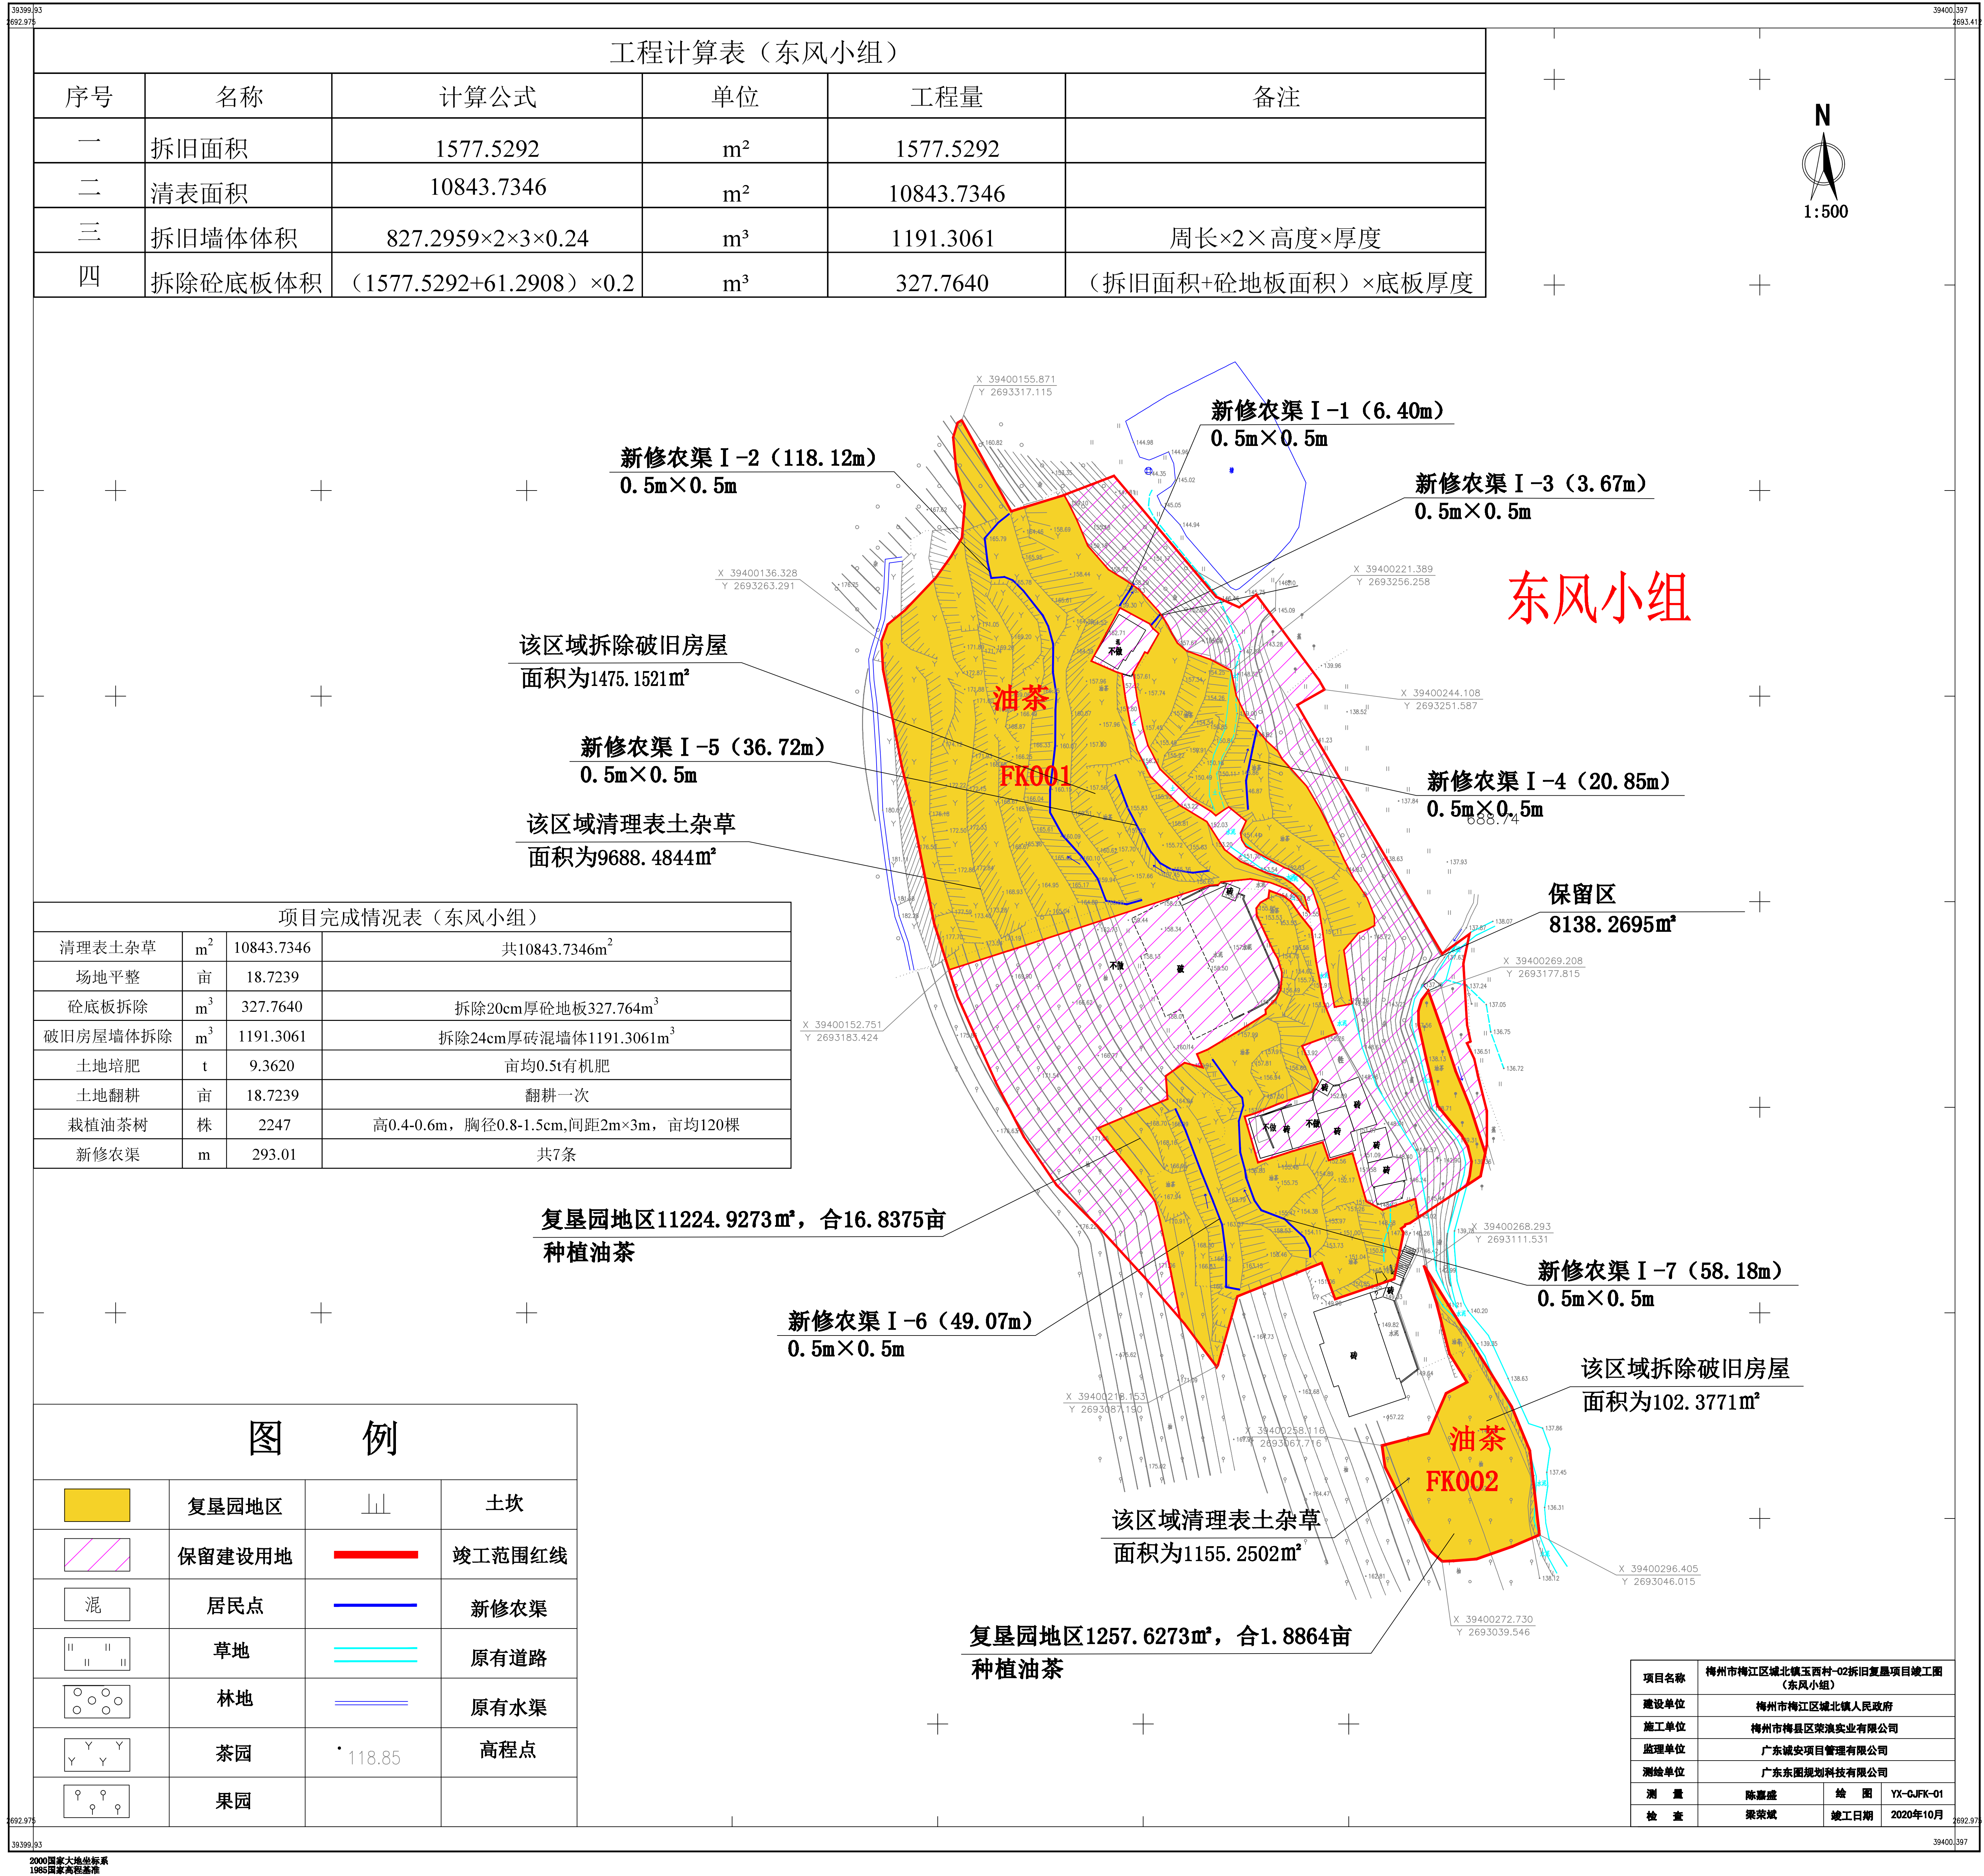

工程计算表（东风小组）

序号	名称	计算公式	单位	工程量	备注
一	拆旧面积	1577.5292	m ²	1577.5292	
二	清表面积	10843.7346	m ²	10843.7346	
三	拆旧墙体体积	827.2959×2×3×0.24	m ³	1191.3061	周长×2×高度×厚度
四	拆除砼底板体积	(1577.5292+61.2908)×0.2	m ³	327.7640	(拆旧面积+砼地板面积)×底板厚度



项目完成情况表（东风小组）


清理表土杂草	m ²	10843.7346	共10843.7346m ²
场地平整	亩	18.7239	
砼底板拆除	m ³	327.7640	拆除20cm厚砼地板327.764m ³
破旧房屋墙体拆除	m ³	1191.3061	拆除24cm厚砖混墙体1191.3061m ³
土地培肥	t	9.3620	亩均0.5t有机肥
土地翻耕	亩	18.7239	翻耕一次
栽植油茶树	株	2247	高0.4-0.6m, 胸径0.8-1.5cm, 间距2m×3m, 亩均120棵
新修农渠	m	293.01	共7条

图 例

	复垦园地区		土坎
	保留建设用地		竣工范围红线
	居民点		新修农渠
	草地		原有道路
	林地		原有水渠
	茶园		高程点
	果园		

项目名称	梅州市梅江区城北镇玉西村-02拆旧复垦项目竣工图（东风小组）		
建设单位	梅州市梅江区城北镇人民政府		
施工单位	梅州市梅江区荣源实业有限公司		
监理单位	广东诚安项目管理有限公司		
测绘单位	广东东图规划科技有限公司		
测 量	陈嘉盛	绘 图	YX-GJFK-01
检 查	梁荣斌	竣工日期	2020年10月

梅州市梅江区城北镇玉西村-02拆旧复垦项目竣工图（潘屋小组）

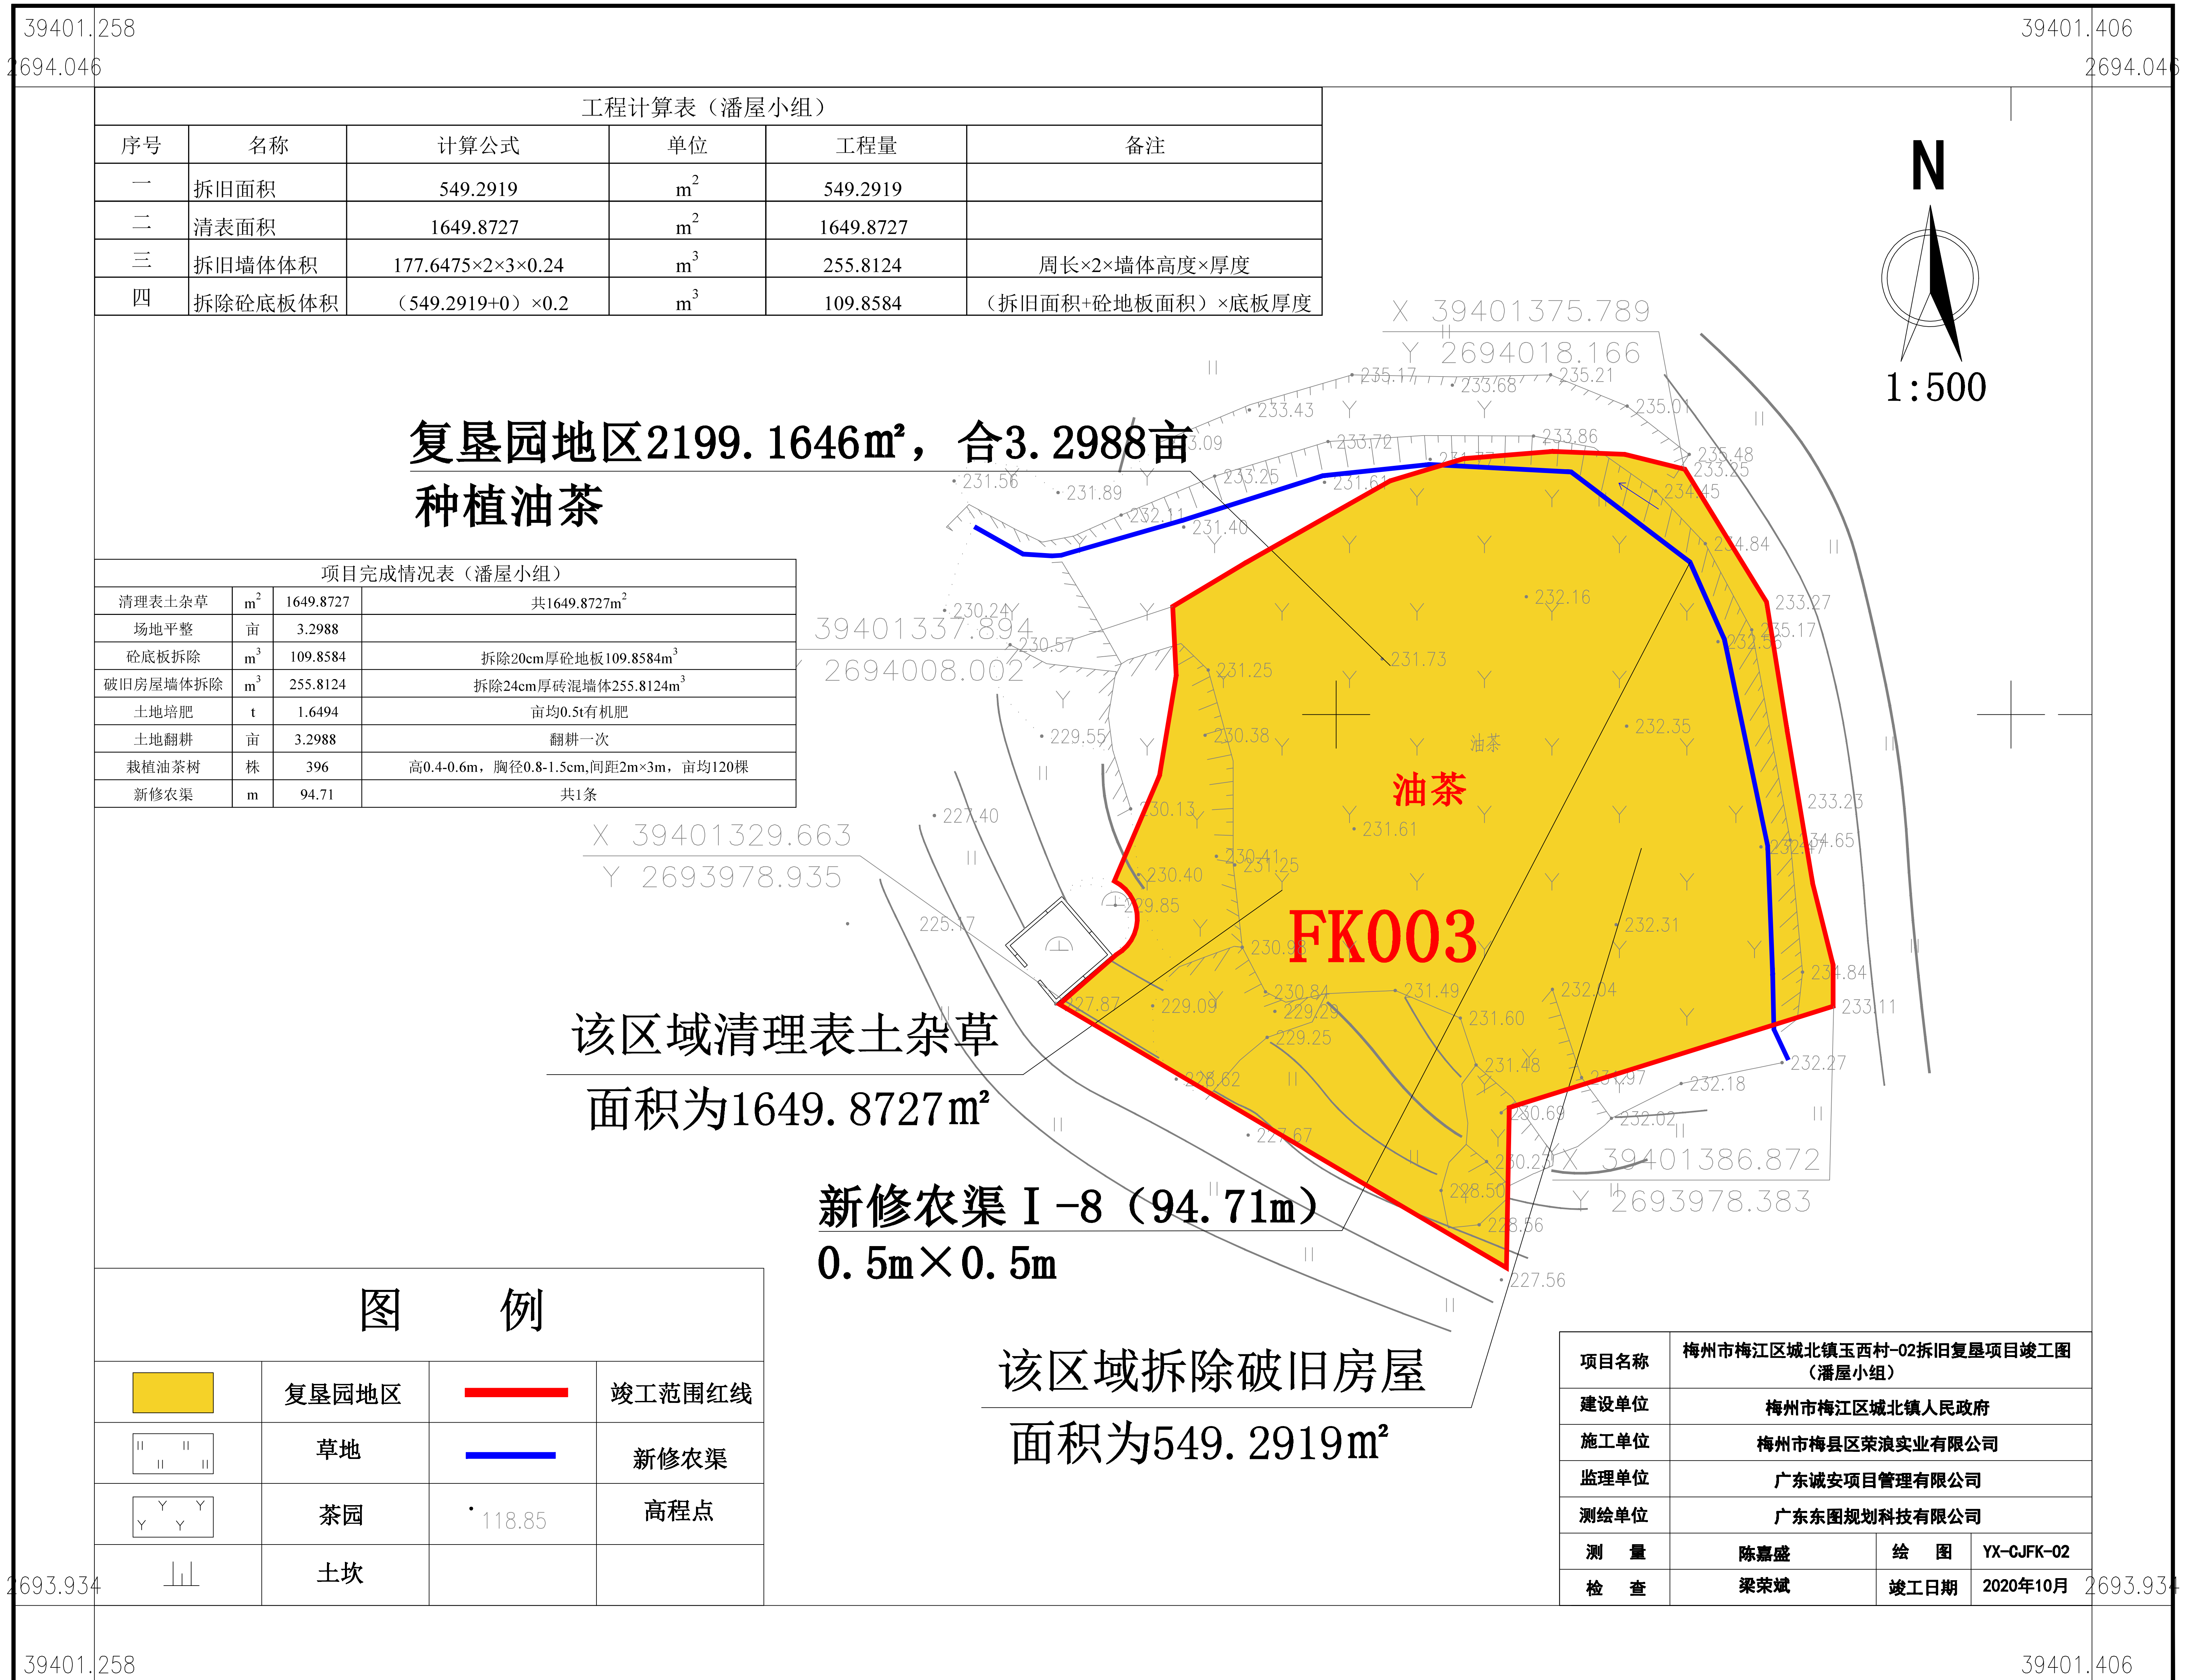

2000国家大地坐标系
1985国家高程基准
