

2019年梅州市梅江区澄滩村-03拆旧复垦项目竣工图 (3/5) (地块FK003)


39408.485

39408.610

676.926

2676.925

完成情况表 (FK003)			
名称	单位	数值	备注
一、拆旧工程			
拆旧房屋残垣拆除	m ²	54.42	拆旧工程量按平均厚度取底按20cm计算
拆旧房屋杂物拆除	m ²	193.03	拆除垃圾24cm厚硬墙体
二、复垦工程			
清理表土杂柴	m ²	396.31	
场地平整	亩	1.4102	亩均0.5吨有机肥,共投入0.71t
土地施肥	亩	1.4102	
耕作层构筑	亩	1.4102	
翻耕	hm ²	0.0940	翻耕一次
栽植柚子树	株	101	柚子树,间距2m*3m,亩均150株,存活率80%,胸径0.8-1.5cm,高40-60cm
新修土沟1.3	m	64.7	宽1.0米,深0.6米
防护工程(镀锌管度)	m ²	80.0	边长镀锌管径80mm ²

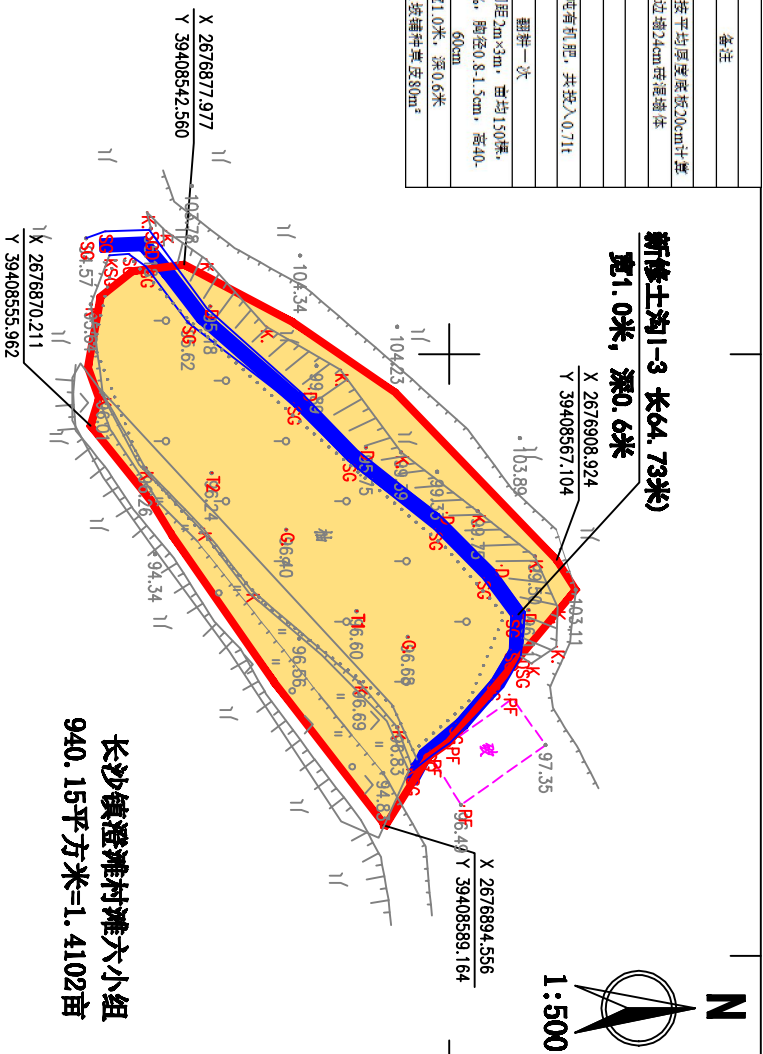

地块编号	地块位置		复垦前地类面积		复垦后地类面积			新增农用地面积	
	镇	村	建设用地	农用地	园地	林地	其他农用地		
FK003	长沙镇	澄滩村	1.4102	0.0000	0.0000	1.4102	0.0000	0.0000	1.4102

注: 新增农用地面积=复垦后园地面积+复垦后林地面积+复垦后其他农用地面积(坑塘水面和农村道路)-复垦前农用地面积

图例			
	复垦地		耕地
	园地		林地
	其他农用地		建设用地
	坑塘水面		农村道路
	现状地类		规划地类

项目名称	梅州市梅江区长沙镇澄滩村-03拆旧复垦项目
建设单位	梅江区长沙镇人民政府
施工单位	广东博通建设工程有限公司梅州梅江区分公司
监理单位	中城通建设咨询有限公司
测绘单位	广东四维测绘技术有限公司
编制日期	2019年12月

39408.485

39408.610

676.827

2676.827

2000国家大地坐标系
1985国家高程基准
